



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN CHILOÉ

DICIEMBRE 2010



Contenido

1. Antecedentes Generales.....	1
2. Análisis Información	3
2.1. Cumplimiento Objetivos Estratégico	3
2.2. Resumen Análisis Financiero.....	5
Conclusiones	6
ANEXO: LISTADO DE PROYECTOS DEL PLAN.....	7



1. Introducción

El principal objetivo del informe de seguimiento del Plan Chiloé, es entregar el avance al año 2010 de los objetivos estratégicos, que están relacionados directamente con los proyectos (prefactibilidades, diseños y obras); lo anterior se obtiene, comparando el plan base con lo que se ha ejecutado y está programado en los diferentes servicios. En este caso se tuvo que rehacer el plan base, porque el Plan Chiloé fue reprogramado en septiembre del año 2010, lo que significó analizar cada iniciativa de inversión para el plan original y definitivo.

2. Antecedentes Generales

Alcances del Plan : Mejorar sustancialmente la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago, fundamental para incentivar su desarrollo y lograr una mejor calidad de vida para todos sus habitantes. Esto se complementa con programas como los de Agua Potable Rural, que mejoran directamente la calidad de vida de la gente, y otros que están destinados a preservar el patrimonio cultural de la isla.

Objetivos Estratégicos Relacionados con Infraestructura MOP

1. Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago.
2. Mejorar calidad de vida de los habitantes.
3. Preservación del patrimonio cultural de la isla.

Territorio : Provincia de Chiloé

Validación : Tras declararse desierta la licitación de la concesión del puente sobre el canal de Chacao, S.E la Presidenta de la República anunció el Plan de Desarrollo Integral de Chiloé, que contempla la aplicación de políticas públicas en una amplia variedad de áreas. Entre las más relevantes están infraestructura, educación, salud y electrificación rural.

Resumen Antecedentes

	Base Año (Octubre 2008- Septiembre 2010)	Año Monitoreo (Noviembre 2010)
Número Iniciativas	95	95
Inversión (moneda año 2010)	\$ 462.025 millones (sin Concesiones)	\$ 468.672 millones (sin Concesiones)
Organismos participantes Extra MOP	Ministerio de Transportes, CORFO, Ministerio de Salud Asociación de Municipios	Ministerio de Transportes, CORFO, Ministerio de Salud Asociación de Municipios
Organismos participantes MOP	DGOP DOP Dirección de Vialidad Dirección de Aeropuertos Dirección de Arquitectura DOH DIRPLAN	DGOP DOP Dirección de Vialidad Dirección de Aeropuertos Dirección de Arquitectura DOH DIRPLAN
Origen de los Datos	Coordinación del Plan, Sistemas Exploratorio y Safi	Coordinación del Plan, Sistemas Exploratorio y Safi
Observaciones:		
<ul style="list-style-type: none"> • No se cuenta con Sistema de indicadores formal. Se ha considerado unidades físicas, cuando estuvieron disponibles • Se reprogramaron las inversiones de los proyectos a partir del año 2010. 		

3. Análisis Información


3.1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos

a) Numero proyectos y/o Acciones por Objetivo estratégico

El plan al año 2010 considera un total de 95 proyectos los que se distribuyen por Servicio y Objetivo Estratégico como se señala en gráfico adjunto. Esto es:

- Conectividad: 62 Proyectos
- Calidad de Vida: 30 Proyectos
- Patrimonio Cultural: 3 Proyectos

Se debe puntualizar que el número de proyectos respecto del año base, se mantuvo y los cambios relevantes se produjeron al reprogramar obras para después del año 2014.

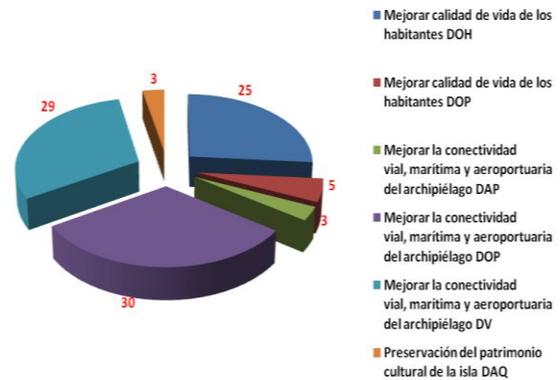


Fuente: Dirplan

b) Etapas cumplidas por objetivo estratégico

En gráfico siguiente, se puede apreciar que del total de los proyectos de Conectividad 25 han sido terminados y 12 están en ejecución, lo que representa casi un 60%; además, están en ejecución y se inician en 2011, 14 diseños de ingeniería en todo el plan, lo que lleva a tener disponibles en el corto plazo casi toda la cartera de proyectos para llevar a cabo su construcción.

De los 20 proyectos que se inician después del año 2014, 11 corresponden a caminos básicos de la isla; sin embargo entre la construcción del Puente Dalcahue y la Ampliación y Reposición de la Ruta 5 en dos tramos se invertirá más del 58% de los recursos.

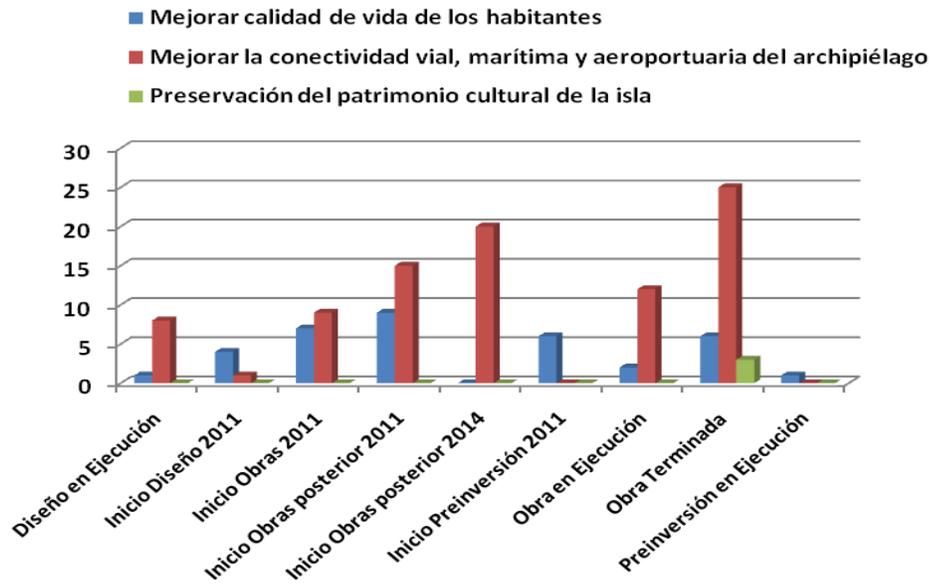

Fuente: Dirplan

c) Avance de Indicadores por Objetivo estratégico

El cuadro siguiente muestra el estado de situación de los indicadores disponibles para el Plan Chiloé:

	Tipología Obra	Indicador Físico/ Social	Meta Plan	Avance Noviembre 2010		Observación	
				Avance	%		
Conectividad	Vialidad	Caminos	Kilómetros	360	135	37,5	
	Vialidad	Puentes	Metros	1.520	170	11,2	
	Aeropuertos	Aeródromos	N°	3	2	66,7	
	Obras Portuarias	Facilidades Portuarias Menores	N°	30	12	40,0	
Calidad de Vida	APR		Arranques	1.614	338 (*)	20,9	En 13 obras no se dispone de información
	Obras Portuarias	Facilidades Portuarias Mayores	N°	5	1	20,0	
Patrimonio Cultural	Arquitectura	Edificación Pública	Beneficiarios				En ninguno de los tres casos se dispone de información fidedigna

Fuente: Dirplan


(*) El avance en número de arranques corresponde a proyectos terminados a noviembre 2010.

d) Avance Financiero por Objetivo estratégico

Los 3 proyectos correspondientes a la Preservación del Patrimonio Cultural de la Isla están terminados.

Hasta el año 2010 \$ 7.994 millones han sido destinados a Mejorar Calidad de Vida de los Habitantes de un monto total a invertir de \$ 24.880 millones.

En Mejorar la Conectividad Vial, Marítima y Aeroportuaria del Archipiélago se han invertido \$ 89.041 millones.

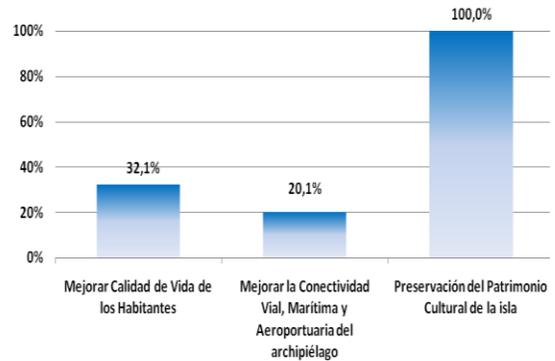

Fuente: Dirplan

3.2. Resumen Análisis Financiero

El cuadro siguiente señala la **inversión sectorial** contemplada para la ejecución del Plan en miles de pesos.

	Servicios	Inversión al 2009	2010	2011	2012-2014	Posterior 2014
Conectividad	Aeropuertos	8.356.867	7.759.994	7.350.483	0	0
	Obras Portuarias	11.059.027	7.476.227	3.175.232	6.658.560	0
	Vialidad	43.020.277	11.368.151	16.507.512	75.032.300	244.850.000
	Subtotal Conectividad	62.436.171	26.604.372	27.033.227	81.690.860	244.850.000
Patrimonio Cultural	Arquitectura	409.322	767.905	0	0	0
	Subtotal Patrimonio Cultural	409.322	767.905	0	0	0
Calidad de Vida	APR	1.004.882	657.456	390.234	5.502.962	0
	DOP	3.644.120	2.687.242	311.521	10.681.661	0
	Subtotal Calidad de Vida	4.649.002	3.344.698	701.755	16.184.623	0
Total (Noviembre 2010)		67.494.495	30.716.975	27.734.982	97.875.483	244.850.000
Base (Oct. 2008-Sep. 2010)		56.266.873	32.454.473	29.314.109	99.139.718	244.850.000

Fuente: Dirplan

Los montos de inversión hasta el año 2009 fueron superiores en un 20% a lo programado inicialmente; sin embargo, a partir del año 2010 tienden a ajustarse, fundamentalmente porque el Plan Chiloé fue reprogramado, lo que implicó que un monto importante de inversiones fuera diferido para después del año 2014. Es relevante, destacar que todos los proyectos considerados al confeccionar el Plan Chiloé en su primera versión, se han llevado a cabo, están siendo ejecutados o han sido incluidos en la nueva programación realizada en septiembre del año 2010.

Conclusiones

A. Objetivos Específicos	B. Resultados Esperados	C. Avance
Mejorar sustancialmente la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	<ul style="list-style-type: none"> • De los 62 proyectos asociados a este objetivo se esperaba terminar 29 obras: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obras Portuarias: 14 ✓ Vialidad : 13 ✓ Aeropuertos : 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Finalmente, se han concluido 25 obras, las cuales se detallan a continuación por servicio: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obras Portuarias: 12 ✓ Vialidad : 11 ✓ Aeropuertos : 2
Mejorar la calidad de vida de su población, reduciendo el actual déficit de disponibilidad de equipamiento comunitario básico	<ul style="list-style-type: none"> • De los 30 proyectos relacionados con este objetivo, se planteó que terminarían 7 obras: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obras Portuarias: 2 ✓ APR : 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Se han realizado 6 obras, las cuales se detallan a continuación por servicio: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obras Portuarias: 1 ✓ APR : 5
Preservar el Patrimonio Cultural de la Isla de Chiloé	<ul style="list-style-type: none"> • De los 3 proyectos asociados a este objetivo se esperaba terminar todos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Arquitectura:3 	<ul style="list-style-type: none"> • Se terminaron los 3 proyectos programados
<p>Resumen del Logro de los Objetivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se puede señalar que el plan tuvo un cumplimiento un 87%, ya que se terminaron 34 de los 39 proyectos; además, los otros 5 terminan su ejecución el año 2011. • La proyección para los próximos años es bastante buena, debido al cambio de programación de varios proyectos. 		

ANEXO: LISTADO DE PROYECTOS DEL PLAN

Objetivo Estratégico	Servicio	Código BIP	Proyecto	Inversión al 2009	Inversión 2010	Programado 2011	Programado 2012-2014	Posterior 2014	Estado Proyecto
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30068154-0	INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CALLE COMUNA DE ANCUD			5.358	8.037		Inicio Diseño 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30068154-0	INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CALLE COMUNA DE ANCUD				100.000		Inicio Diseño 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	20151094-0	INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL TOCOIHUE-TENAUN ALTO, COMUNA DALCAHUE	328.301					Obra Terminada
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30068977-0	INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE TRINCAO COMUNA DE QUELLON	12.283	171.448				Obra Terminada
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30068975-0	INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHADMO CENTRAL COMUNA DE QUELLON	13.561	229.085				Obra Terminada
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30068151-0	INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PUTIQUE COMUNA DE QUINCHAO	180.924	256.903				Obra Terminada
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30034234-0	INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PIRUQUINA, COMUNA DE CASTRO	469.813					Obra Terminada
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	SIN CÓDIGO	INSTALACIÓN SERVICIO APR DE PUCATUE			42.162			Inicio Preinversión 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	SIN CÓDIGO	INSTALACIÓN SERVICIO APR DE PUCATUE			1	13.394		Inicio Preinversión 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	SIN CÓDIGO	INSTALACIÓN SERVICIO APR DE PUCATUE				186.514		Inicio Preinversión 2011

Objetivo Estratégico	Servicio	Código BIP	Proyecto	Inversión al 2009	Inversión 2010	Programado 2011	Programado 2012-2014	Posterior 2014	Estado Proyecto
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30069784-0	INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PUREO COMUNA DE QUEILEN			84.091			Inicio Preinversión 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30069784-0	INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PUREO COMUNA DE QUEILEN			1	13.394		Inicio Preinversión 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30069784-0	INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PUREO COMUNA DE QUEILEN				177.834		Inicio Preinversión 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30055889-0	INSTALACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO COMUNA DE QUINCHAO		10	55.923			Preinversión en Ejecución
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30085589-0	INSTALACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO COMUNA DE QUINCHAO			5.358	8.037		Inicio Diseño 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30085589-0	INSTALACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO COMUNA DE QUINCHAO				408.064		Inicio Diseño 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30068972-0	INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE NATRI COMUNA DE CHONCHI		10	197.333			Obra en Ejecución
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30085590-0	INSTALACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AGUA FRESCA COMUNA DE QUELLON			1	200.806		Inicio Obras 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30085592-0	INSTALACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CALEN - SAN JUAN COMUNA DE DALCAHUE			1	420.204		Inicio Obras 2011

Objetivo Estratégico	Servicio	Código BIP	Proyecto	Inversión al 2009	Inversión 2010	Programado 2011	Programado 2012-2014	Posterior 2014	Estado Proyecto
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30068976-0	INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ACHEUQUE COMUNA DE PUQUELDON				278.153		Inicio Obras posterior 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	SIN CÓDIGO	INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE COQUIAO (*) COMUNA DE ANCUD				200.000		Inicio Obras posterior 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	20190972-0	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE DEGAN			1	474.813		Inicio Obras 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30068156-0	INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE EL QUILAR COMUNA DE ANCUD				194.986		Inicio Obras posterior 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30069783-0	INSTALACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE HUYAR ALTO COMUNA DE CURACO DE VELEZ			1	386.613		Inicio Obras 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	SIN CÓDIGO	INSTALACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE PILLUCO COMUNA DE ANCUD				306.158		Inicio Obras posterior 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	SIN CÓDIGO	INSTALACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE PUGUEÑÚN COMUNA DE ANCUD			1	358.172		Inicio Obras 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30069786-0	INSTALACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE QUILEN QUELLON				324.664		Inicio Obras posterior 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	SIN CÓDIGO	INSTALACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE TANTAUCO (*) COMUNA DE ANCUD				200.000		Inicio Obras posterior 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	SIN CÓDIGO	INSTALACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE ISLA AÑIHUE COMUNA DE			1	203.359		Inicio Obras 2011

Objetivo Estratégico	Servicio	Código BIP	Proyecto	Inversión al 2009	Inversión 2010	Programado 2011	Programado 2012-2014	Posterior 2014	Estado Proyecto
			QUEMCHI						
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	SIN CÓDIGO	INSTALACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE ISLA COLDITA COMUNA DE QUELLÓN				443.030		Inicio Obras posterior 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOH	30071718-0	INSTALACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE ISLA LIN LIN QUINCHAO			1	596.730		Inicio Obras 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DAP	30067596-0	MEJORAMIENTO AERODROMO QUELLON QUELLON, CHILOE, X REGION.	2.555.693					Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DAP	30066653-0	CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO ISLA DE CHILOE	5.220.983	7.759.994	7.350.483			Obra en Ejecución
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DAP	30036781-0	CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS DE LA X REGION	580.191					Obra Terminada
Preservación del patrimonio cultural de la isla	DAQ	30061025-0	RESTAURACION FUERTES CHAICURA Y BATERIA BALCACURA - PLAN CHILOE PROVINCIA DE CHILOE, COMUNA DE ANCUO	251.762	767.905				Obra Terminada
Preservación del patrimonio cultural de la isla	DAQ	30068872-0	INVESTIGACION Y ELABORACION GUIAS DE DISEÑO EDIFICACION PUBLICA CHILOTA - PLAN CHILOE PROVINCIA DE CHILOE	54.899					Obra Terminada

Objetivo Estratégico	Servicio	Código BIP	Proyecto	Inversión al 2009	Inversión 2010	Programado 2011	Programado 2012-2014	Posterior 2014	Estado Proyecto
Preservación del patrimonio cultural de la isla	DAQ	30068874-0	MEJORAMIENTO ENTORNO EDIFICIOS Y/O ESPACIOS PUBLICOS DE VALOR PATRIMONIAL- PLAN CHILOE PROVINCIA DE CHILOE	102.661					Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	20137701-0	CONSTRUCCION RAMPA METAHUE, ISLA BUTACHAUQUE, QUEMCHI	638.007	86.129				Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30033852-0	REPOSICION RAMPA TENAUN, DALCAHUE	605.678					Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30033883-0	MEJORAMIENTO INTEGRAL RAMPAS SECTOR CHULCHUY Y HUICHA -	1.573.271					Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30033907-0	CONSTRUCCION RAMPA ISLA AULIN, QUEMCHI	390.140					Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30041448-0	CONSTRUCCION RAMPA PARA PASAJEROS Y CARGA ISLA CHAULLIN, QUELLÓN	567.623					Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30043310-0	CONSTRUCCION RAMPA ISLA ACUY, QUEILEN	467.797					Obra Terminada

Objetivo Estratégico	Servicio	Código BIP	Proyecto	Inversión al 2009	Inversión 2010	Programado 2011	Programado 2012-2014	Posterior 2014	Estado Proyecto
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30043339-0	REPOSICION RAMPA ISLA TRANQUI, QUEILEN	913.955					Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30063471-0	CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2007, X REGION	1.692.451	147.717				Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30067550-0	CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO CANAL DE CHACAO -	1.144.150	5.844.338	156.279			Obra en Ejecución
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30067643-0	MEJORAMIENTO RAMPAS CANAL DE CHACAO	1.510.020					Obra Terminada
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOP	30067687-0	CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPOSITO DE CASTRO	2.453.830	2.470.583	87.502			Obra en Ejecución
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30069174-0	CONSERVACION RAMPAS EL PASAJE Y COYUMBE DALCAHUE	204.686					Obra Terminada
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOP	30033914-0	REPOSICION RAMPA SECTOR LOS PINOS, ISLA LIN-LIN	1.088.813	62.838				Obra Terminada
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOP	30067696-0	AMPLIACION PUERTO DE CHONCHI		10	115.985	3.320.661		Inicio Obras posterior 2011

Objetivo Estratégico	Servicio	Código BIP	Proyecto	Inversión al 2009	Inversión 2010	Programado 2011	Programado 2012-2014	Posterior 2014	Estado Proyecto
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30068182-0	REPOSICION RAMPA DE QUICAVI, QUEMCHI	603.125	222.900				Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30068183-0	REPOSICION RAMPA DE VOIGUE, QUEMCHI	376.188	204.984				Obra Terminada
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOP	30069173-0	CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO	101.477	153.811	108.034	6.300.000		Diseño en Ejecución
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30071161-0	REPOSICION RAMPA DE PASAJEROS DE DALCAHUE, DALCAHUE	35.559	50.385	1.012.320			Diseño en Ejecución
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30071240-0	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION TAUCOLON, QUEMCHI	59.591	197.744	515.078			Obra en Ejecución
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30071252-0	CONSTRUCCION RAMPA SECTOR CAPILLA ANTIGUA QUENAC, COMUNA QUINCHAO		53.167	42.570	642.615		Diseño en Ejecución
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30071300-0	CONSTRUCCION RAMPA SECTOR LLAGUACH, ISLA CHAULINEC, COMUNA QUINCHAO	59.589	284.068	595.973			Obra en Ejecución

Objetivo Estratégico	Servicio	Código BIP	Proyecto	Inversión al 2009	Inversión 2010	Programado 2011	Programado 2012-2014	Posterior 2014	Estado Proyecto
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30081148-0	CONSTRUCCION MUELLE RIO CHEPU, COMUNA DE ANCUD		31.573	48.467	660.000		Diseño en Ejecución
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30081150-0	CONSTRUCCION RAMPA EN PALQUI CURACO DE VELEZ	14.210	44.335	121.570	1.270.000		Diseño en Ejecución
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30081156-0	CONSTRUCCION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA SECTOR PUCHILCO PUQUELDON			55.326			Diseño en Ejecución
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30081240-0	CONSTRUCCION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA MENOR SECTOR PUNTA HUIITE, ISLA LAITEC		10	68.168	30.000		Diseño en Ejecución
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30081328-0	REPOSICION RAMPA ISLA QUEHUI, SECTOR LOS ANGELES, CASTRO		20.580	48.970			Diseño en Ejecución
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30081332-0	CONSTRUCCION RAMPA SECTOR COÑAB, COMUNA DE QUINCHAO		64.197	34.097	640.085		Diseño en Ejecución
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30081370-0	REPOSICION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA MENOR DE CASTRO	202.987	224.050				Obra en Ejecución

Objetivo Estratégico	Servicio	Código BIP	Proyecto	Inversión al 2009	Inversión 2010	Programado 2011	Programado 2012-2014	Posterior 2014	Estado Proyecto
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30082794-0	CONSTRUCCION RAMPA SECTOR PUNTA PAULA, ISLA COLDITA, COMUNA DE QUELLON		10	99.117	550.000		Inicio Obras posterior 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30082824-0	CONSTRUCCION RAMPA SECTOR OSTRICULTURA, ISLA APIAO		10	96.617	550.000		Inicio Obras posterior 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30082828-0	CONSTRUCCION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA MENOR SECTOR BLANCHARD		10	99.117	550.000		Inicio Obras posterior 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30082830-0	CONSTRUCCION RAMPA DE CONEXION SECTOR PIEDRA LILE, ISLA LAITEC		10	68.168	581.980		Inicio Obras posterior 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30082832-0	CONSTRUCCION RAMPA ISLA BUTACHAUQUE SECTOR NAYAHUE QUEMCHI		10	92.425	550.000		Inicio Obras posterior 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DOP	30083651-0	REPOSICION RAMPA QUINTERQUEN ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI			20.970	633.880		Inicio Diseño 2011
Mejorar calidad de vida de los habitantes	DOP	SIN CÓDIGO	PASEO BORDE COSTERO DE CHACAO				1.061.000		Inicio Obras posterior 2011

Objetivo Estratégico	Servicio	Código BIP	Proyecto	Inversión al 2009	Inversión 2010	Programado 2011	Programado 2012-2014	Posterior 2014	Estado Proyecto
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	20177344-0	REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CASTRO - CHONCHI -	6.458.648	38.452				Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30004005-0	MEJORAMIENTO RUTA W-195 QUEMCHI -TOCOIHUE-DALCAHUE .	5.073.157	675.255				Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30033667-0	CONSERVACION RED VIAL X-REGION, PLAN INDIGENA	1.461.369					Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30035719-0	MEJORAMIENTO RUTA CRUCE LONGITUDINAL- OQUELDAN-CHAIGUAO,ROL W-881 -	1.956.857					Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30043486-0	CONSERVACION GLOBAL RED VIAL X-REGION AÑO 2006 -	2.925.886					Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30051153-0	REPOSICION PUENTES PUNTRA Y BUTALCURA, CAMINO LONG. SUR PROV. CHILOE	4.711.681	17.542				Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30051900-0	MEJORAMIENTO RUTA W-15-175 SECTOR:CRUCE RUTA 5-PUMANZANO	1.088.797	3.349.124	1.530.261			Obra en Ejecución

Objetivo Estratégico	Servicio	Código BIP	Proyecto	Inversión al 2009	Inversión 2010	Programado 2011	Programado 2012-2014	Posterior 2014	Estado Proyecto
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30061660-0	CONSERVACION GLOBAL DE LA RED VIAL X REGION 2007	1.774.469	91.696				Obra en Ejecución
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30063533-0	AMPLIACION RUTA 5 DALCAHUE-PIDPID; NAHUILTAD-CHONCHI;BY PASS CASTR .	123.428	163.538	33.793		25.401.000	Inicio Obras posterior 2014
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30063533-0	AMPLIACION RUTA 5 DALCAHUE-PIDPID; NAHUILTAD-CHONCHI;BY PASS CASTR .	123.428	163.538	33.793		17.000.000	Inicio Obras posterior 2014
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30063533-0	AMPLIACION RUTA 5 DALCAHUE-PIDPID; NAHUILTAD-CHONCHI;BY PASS CASTR .	123.428	163.538	33.793	7.550.000	25.450.000	Inicio Obras posterior 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30066076-0	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION RUTA W-853. SECTOR HUICHA-SANTA MARIA (KM 6,8 AL KM 28,5) .	4.748.625					Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30068834-0	REPOSICION AMPLIACION RUTA 5 VARIOS TRAMOS. S: BIF.PUPELDE-QUELLON .-	83.117			710.000	20.260.000	Inicio Obras posterior 2011

Objetivo Estratégico	Servicio	Código BIP	Proyecto	Inversión al 2009	Inversión 2010	Programado 2011	Programado 2012-2014	Posterior 2014	Estado Proyecto
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30068834-0	REPOSICION AMPLIACION RUTA 5 VARIOS TRAMOS. S: BIF.PUPELDE-QUELLON .-	83.117			3.900.000	700.000	Inicio Obras posterior 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30068834-0	REPOSICION AMPLIACION RUTA 5 VARIOS TRAMOS. S: BIF.PUPELDE-QUELLON .-	83.117				1.701.000	Inicio Obras posterior 2014
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30068834-0	REPOSICION AMPLIACION RUTA 5 VARIOS TRAMOS. S: BIF.PUPELDE-QUELLON .-	223.664	36.913		10.320.000		Inicio Obras posterior 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30068834-0	REPOSICION AMPLIACION RUTA 5 VARIOS TRAMOS. S: BIF.PUPELDE-QUELLON .-			100.000	8.100.000		Inicio Obras 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30068834-0	REPOSICION AMPLIACION RUTA 5 VARIOS TRAMOS. S: BIF.PUPELDE-QUELLON .-	223.664	36.914	60.000	9.760.000	16.516.000	Inicio Obras 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30099712-0	REPOSICION PUENTE MECHAICO Y ACCESOS EN RUTA 5 .	83.117		70.000	3.615.000		Inicio Obras 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30094044-0	REPOSICION PUENTE SAN ANTONIO EN RUTA 5 CHILOE	83.117		1.154.000	3.474.000		Inicio Obras 2011

Objetivo Estratégico	Servicio	Código BIP	Proyecto	Inversión al 2009	Inversión 2010	Programado 2011	Programado 2012-2014	Posterior 2014	Estado Proyecto
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069055-0	MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO -	237.004				9.330.000	Inicio Obras posterior 2014
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069070-0	MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO-QUEMCHI -	100.470	126.668	19.424		11.220.000	Inicio Obras posterior 2014
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069072-0	MEJORAMIENTO RUTA V-990,W-131 S: PARGUA-PUNTA CORONEL Y ACCESO A RAMPAS S:CHACAO .-	1.403.181					Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069075-0	MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN - DALCAHUE	255.494			1.980.000	9.080.000	Inicio Obras posterior 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30074631-0	INSTALACION Y REPOSICION SEÑALES Y ELEMENTOS SEG. VIAL PLAN CHILOE .-	897.457					Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30076875-0	CONSTRUCCION BY PASS CHONCHI EXTENSION CALLE SARGENTO CANDELARIA	817.835	17.922				Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30083665-0	CONSTRUCCION PTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE					45.076.000	Inicio Obras posterior 2014

Objetivo Estratégico	Servicio	Código BIP	Proyecto	Inversión al 2009	Inversión 2010	Programado 2011	Programado 2012-2014	Posterior 2014	Estado Proyecto
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30076721-0	AMPLIACION RUTA 5. SECTOR: VARIANTE ANCUD .-	540.682	675.013	960.000	8.506.000	500.000	Obra en Ejecución
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30076721-0	AMPLIACION RUTA 5. SECTOR: VARIANTE ANCUD .-				20.000	2.980.000	Inicio Obras posterior 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30077695-0	CONSTRUCCION RUTA 5. SECTOR: VARIANTE CHACAO	149.621	2.959.343	1.015.133			Obra en Ejecución
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30078461-0	AMPLIACION RUTA 5 EN CHILOE. SECTOR: FIN VARIANTE ANCUD - BIFURCACION PUPELDE					2.455.000	Inicio Obras posterior 2014
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069504-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS ISLA CHILOE (GRUPO 2) .	41.158				2.380.000	Inicio Obras posterior 2014
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069504-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS ISLA CHILOE (GRUPO 2) .	41.158				1.800.000	Inicio Obras posterior 2014
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069504-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS ISLA CHILOE (GRUPO 2) .	41.158				970.000	Inicio Obras posterior 2014

Objetivo Estratégico	Servicio	Código BIP	Proyecto	Inversión al 2009	Inversión 2010	Programado 2011	Programado 2012-2014	Posterior 2014	Estado Proyecto
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069504-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS ISLA CHILOE (GRUPO 2) .	41.158		2.046.000	805.000		Inicio Obras 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069504-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS ISLA CHILOE (GRUPO 2) .	41.158			10.000	1.434.000	Inicio Obras posterior 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069504-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS ISLA CHILOE (GRUPO 2) .	41.158		1.774.000	1.554.000		Inicio Obras 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069504-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS ISLA CHILOE (GRUPO 2) .	41.158				2.600.000	Inicio Obras posterior 2014
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069504-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS ISLA CHILOE (GRUPO 2) .	41.158				809.000	Inicio Obras posterior 2014
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069504-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS ISLA CHILOE (GRUPO 2) .	41.158				2.100.000	Inicio Obras posterior 2014

Objetivo Estratégico	Servicio	Código BIP	Proyecto	Inversión al 2009	Inversión 2010	Programado 2011	Programado 2012-2014	Posterior 2014	Estado Proyecto
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069504-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS ISLA CHILOE (GRUPO 2) .	41.158				3.180.000	Inicio Obras posterior 2014
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069504-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS ISLA CHILOE (GRUPO 2) .	31.319	20.011	880.000	280.000		Inicio Obras 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069504-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS ISLA CHILOE (GRUPO 2) .	31.319	20.011	2.640.000	1.421.000		Inicio Obras 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069504-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS ISLA CHILOE (GRUPO 2) .	31.319	30.192		1.421.000	300.000	Inicio Obras posterior 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069504-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS ISLA CHILOE (GRUPO 2) .	31.319	30.192			2.120.000	Inicio Obras posterior 2014

Objetivo Estratégico	Servicio	Código BIP	Proyecto	Inversión al 2009	Inversión 2010	Programado 2011	Programado 2012-2014	Posterior 2014	Estado Proyecto
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069504-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS ISLA CHILOE (GRUPO 2) .	31.319	30.192			1.970.000	Inicio Obras posterior 2014
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069504-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS ISLA CHILOE (GRUPO 2) .	31.319	30.192			6.515.000	Inicio Obras posterior 2014
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069504-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS ISLA CHILOE (GRUPO 2) .	31.319	30.192			1.870.000	Inicio Obras posterior 2014
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069502-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS ISLA CHILOE (GRUPO 1) .	3.338.341	398.427				Obra Terminada
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30076541-0	CONSERVACION GLOBAL RED VIAL X REGION AÑO 2008 .	1.368.385	497.780	500.000	2.087.000	5.761.000	Obra en Ejecución
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30076541-0	CONSERVACION GLOBAL RED VIAL X REGION AÑO 2008 .	727.081	890.517	110.575	2.030.000	4.790.000	Obra en Ejecución

Objetivo Estratégico	Servicio	Código BIP	Proyecto	Inversión al 2009	Inversión 2010	Programado 2011	Programado 2012-2014	Posterior 2014	Estado Proyecto
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30076541-0	CONSERVACION GLOBAL RED VIAL X REGION AÑO 2008 .	612.803	753.638	355.020	2.030.000	4.790.000	Obra en Ejecución
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30083652-0	REPOSICION CONSTRUCCION RUTAS W-120-160. SECTOR: HUICHA - CAULIN	124.834	49.730			5.534.000	Inicio Obras posterior 2014
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069840-0	MEJORAMIENTO CONSTR. COSTANERA CASTRO Y VIAS O` HIGGINS-SAN MARTIN -	127.864			2.100.000	1.900.000	Inicio Obras posterior 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069840-0	MEJORAMIENTO CONSTR. COSTANERA CASTRO Y VIAS O` HIGGINS-SAN MARTIN -	127.864				6.358.000	Inicio Obras posterior 2014
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30069840-0	MEJORAMIENTO CONSTR. COSTANERA CASTRO Y VIAS O` HIGGINS-SAN MARTIN -	127.864	10.000	3.153.000	1.187.300		Inicio Obras 2011
Mejorar la conectividad vial, marítima y aeroportuaria del archipiélago	DV	30080314-0	MEJORAMIENTO RUTAS W-15. SECTOR: PUMANZANO – LINAO		61.620	38.720	2.172.000		Inicio Obras posterior 2011
