


Ministerio de Obras Públicas  
Dirección de Planeamiento  
Subdirección de Planificación Estratégica



# **INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONECTIVIDAD AUSTRAL**

**DICIEMBRE 2010**



## Contenido

1. Antecedentes Generales.....	1
2. Análisis Información .....	3
2.1. Cumplimiento Objetivos Estratégico .....	3
2.2. Resumen Análisis Financiero.....	6
Conclusiones.....	7
ANEXO: LISTADO DE PROYECTOS DEL PLAN.....	8



## 1. Introducción

Este informe tiene como objetivo fundamental dar un seguimiento al año 2010, a las iniciativas propuestas en el Plan de Conectividad Austral, analizando el avance de los objetivos estratégicos, las inversiones involucradas y los proyectos específicos en sus fases de prefactibilidad, diseño y obras. Se debe puntualizar que el plan original ha sido cambiado y que todavía no está confeccionado el plan definitivo; por lo tanto, se tomó como referencia el primer plan del año 2009 y se comparó con lo ejecutado y programado a noviembre del año 2010, lo que implicó que fueran incluidos nuevos proyectos que están siendo incorporados, aunque se debe insistir que aún está en confección el plan final.

## 2. Antecedentes Generales

**Alcances del Plan:** Plan de Inversiones enfocado a consolidar o abrir nuevas opciones para la integración nacional en la zona austral de Chile, colaborando así a materializar objetivos específicos de desarrollo geopolítico, social y consolidación productiva a nivel local. Estas directrices apuntan a que la infraestructura y la operación del transporte, además de recoger las demandas propias del crecimiento económico y social, se constituyan en un sustento eficiente y moderno para el desarrollo de nuestro territorio en toda su extensión.

Su objetivo es dotar a los habitantes y turistas de las regiones australes (Los Lagos, Aysén y Magallanes) de servicios integrales de transporte vial, aeroportuario, marítimo, fluvial y lacustre, con calidad garantizada

### **Objetivos Estratégicos Relacionados con Infraestructura MOP**

Las acciones definidas en el Plan de Conectividad Austral, apuntan como objetivo el facilitar la accesibilidad a localidades en situación de aislamiento extremo, crítico y alto en la zona Austral de Chile; y el desarrollo de Infraestructura y servicios de Transporte a fin de potenciar las actividades económicas, la soberanía y los asentamientos humanos.

Esto a través de la mantención y ampliación de la Infraestructura de Transporte en la zona Austral del país, y el mejoramiento de la calidad de servicio que estas ofrecen, para:

1. Mejorar Conectividad de Localidades Aisladas
2. Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre
3. Consolidar Ejes Longitudinales de Integración
4. Mejorar y Habilitar Pasos Fronterizos
5. Conformar de Circuitos Turísticos
6. Mejorar Conectividad Transversal

**Territorio:** Las acciones definidas en el presente Plan apuntan a consolidar la integración y estructuración de la unidad territorial, compuesta por las regiones: de Los Ríos, de Los Lagos, Aysén y Magallanes

**Validación:** Comité de Transporte de la Secretaría Técnica de Planificación, instancia de coordinación transversal iniciada en 2003 que reunía a los responsables de planificación de cada servicio del MOP y Ministro de Obras Públicas (se define funciones y estructura en Resolución MOP del 16/07/2007)

### Resumen Antecedentes

	<b>Base Año (Marzo 2009)</b>	<b>Año Monitoreo (Noviembre 2010)</b>
<b>Número Iniciativas</b>	<b>100</b>	<b>120</b>
<b>Inversión (moneda año 2010)</b>	\$ 551.030 millones (sin Concesiones)	\$ 411.060 millones (sin Concesiones) (*)
<b>Organismos participantes Extra MOP</b>	Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Subsidios al transporte en zonas australes y Gobiernos Regionales de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y Antártica Chilena.	Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Subsidios al transporte en zonas australes y Gobiernos Regionales de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y Antártica Chilena.
<b>Organismos participantes MOP</b>	Directorio Plan de Conectividad Austral: Servicios Ejecutores MOP, coordina DGOP. Se incluye esquema de gestión para la ejecución del Plan en forma adjunta.  Participan los Servicios siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección General de Obras Públicas</li> <li>• Dirección de Obras Portuarias</li> <li>• Dirección de Vialidad</li> <li>• Dirección de Aeropuertos</li> <li>• Coordinadora General de Concesiones</li> </ul>	Directorio Plan de Conectividad Austral: Servicios Ejecutores MOP, coordina DGOP. Se incluye esquema de gestión para la ejecución del Plan en forma adjunta.  Participan los Servicios siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección General de Obras Públicas</li> <li>• Dirección de Obras Portuarias</li> <li>• Dirección de Vialidad</li> <li>• Dirección de Aeropuertos</li> <li>• Coordinadora General de Concesiones</li> </ul>
<b>Origen de los Datos</b>	Coordinación del Plan, Sistemas Exploratorio y Safi	Coordinación del Plan, Sistemas Exploratorio y Safi
<p>(*) \$ 21.456 son inversiones que aportará el FNDR</p> <p><b>Observaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se cuenta con Sistema de indicadores formal. Se ha considerado unidades físicas, cuando estuvieron disponibles.</li> </ul>		


### 3. Análisis Información

#### 3.1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos

##### a) Numero proyectos y/o Acciones por Objetivo estratégico

El plan al año 2010 considera un total de 119 proyectos los que se distribuyen por Servicio y Objetivo Estratégico como se señala en gráfico adjunto. Esto es:

✓ Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad:	<b>35</b>
✓ Mejoramiento Conectividad Transversal:	<b>10</b>
✓ Mejorar Conectividad de Localidades aisladas:	<b>19</b>
✓ Consolidación Ejes longitudinales de Integración	<b>38</b>
✓ Mejoramiento y Habilitación de Pasos Fronterizos	<b>6</b>
✓ Conformación de Circuitos Turísticos	<b>12</b>

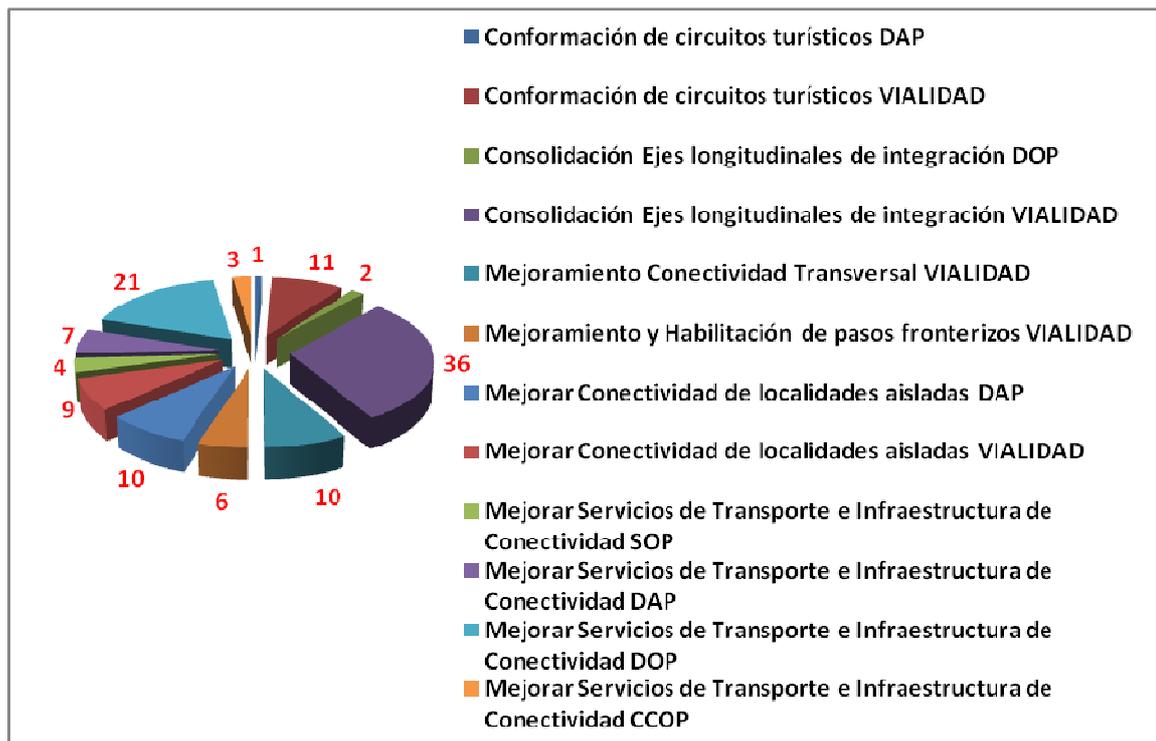


Fuente: Dirplan

Es importante destacar que aunque se eliminaron 37 proyectos, el universo total aumentó porque se incorporaron nuevas iniciativas

**b) Etapas cumplidas por objetivo estratégico**

En el siguiente gráfico se puede apreciar que una gran cantidad de proyectos están en fase de obras, ya sea comenzando, en ejecución o terminada; sin embargo también se desprende que una parte significativa de proyectos no están programados, lo que indica incertidumbre sobre la real posibilidad de llevarlos a cabo; por lo tanto, es imperativo definir sus inversiones en un candelario a futuro.

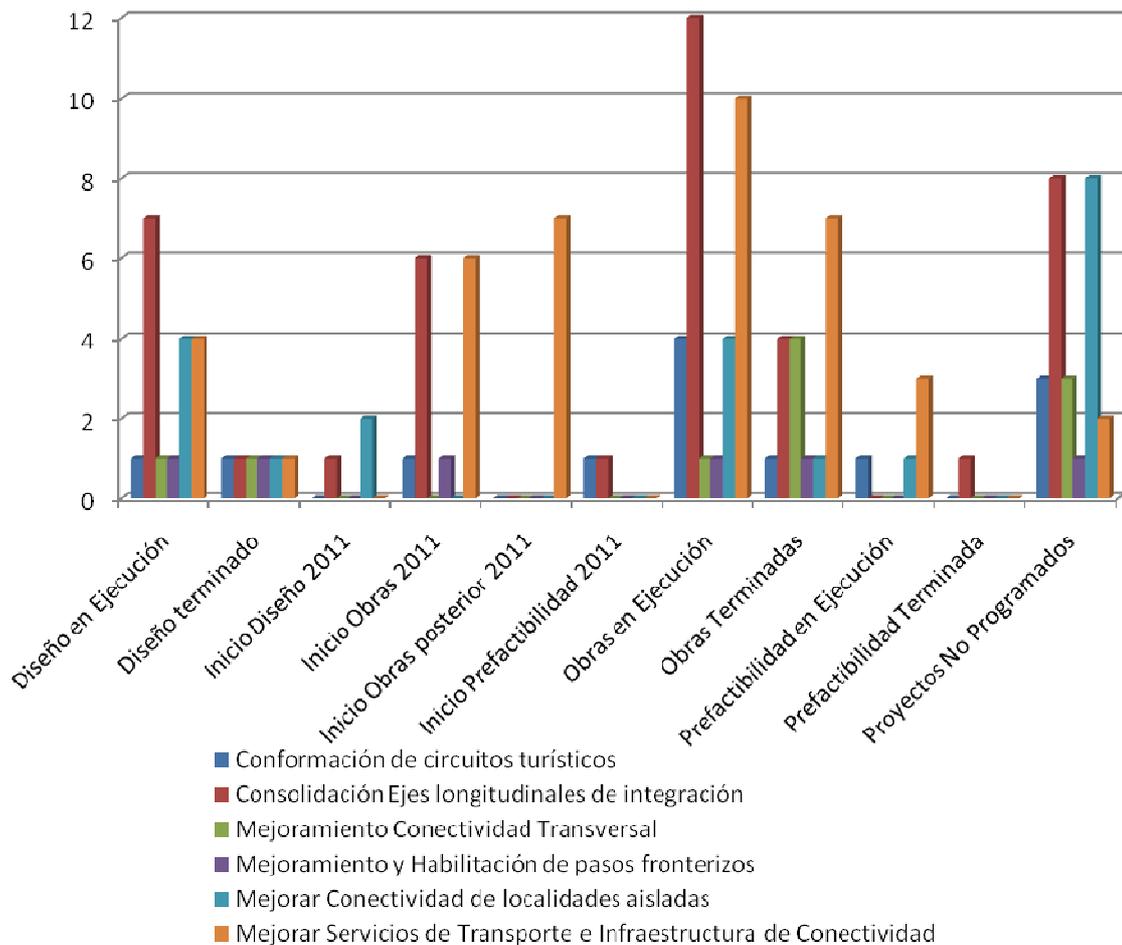

Fuente: Dirplan



**c) Avance de Indicadores por Objetivo estratégico**

El cuadro siguiente muestra el estado de situación de los indicadores disponibles para el Plan de Conectividad Austral.


OBJETIVO ESTRATÉGICO	SERVICIO	TIPOLOGÍA OBRA	INDICADOR FÍSICO/SOCIAL	META PLAN	AVANCE NOVIEMBRE 2010	
					AVANCE	%
<b>Transporte e Infraestructura de Conectividad</b>	Concesiones	Estudios	Nº	3	0	0,0
	Aeropuertos	Aeródromos	Nº	5	3	60,0
	Obras Portuarias	Facilidades Portuarias	Nº	25	3	12,0
<b>Conectividad Transversal</b>	Vialidad	Caminos	Kilómetros	257	45	17,5
	Vialidad	Puentes	Metros	191	191	100,0
<b>Conectividad Localidades Aisladas</b>	Aeropuertos	Aeródromos	Nº	56	6	10,7
	Vialidad	Caminos	Kilómetros	120	24	20,0
<b>Ejes Longitudinales de Integración</b>	Vialidad	Caminos	Kilómetros	711	264	37,1
	Vialidad	Puentes	Metros	326	256	78,5
<b>Mejoramiento y Habilitación de pasos fronterizos</b>	Vialidad	Caminos	Kilómetros	292	63	21,6
<b>Conformación de Circuitos turísticos</b>	Vialidad	Caminos	Kilómetros	208	30	14,4
	Vialidad	Puentes	Metros	127	0	0,0
	Aeropuertos	Facilidades Portuarias	Nº	1	1	100,0

Fuente: Dirplan

#### d) Avance Financiero por Objetivo estratégico

En el gráfico adjunto se muestra el comportamiento (en términos porcentuales) de los 6 objetivos estratégicos del Plan de Conectividad Austral.

Es importante resaltar que la Consolidación de los Ejes Longitudinales, se ha logrado en un 45,1% de su meta y que hay varios tramos pendientes como la Construcción de la Ruta Vicuña – Yendegaia y especialmente la Construcción y Pavimentación de la Ruta 7.

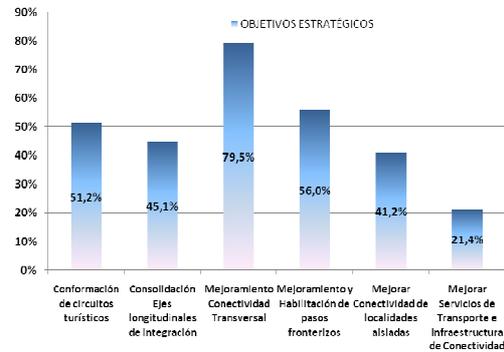

Fuente: Dirplan

### 3.2. Resumen Análisis Financiero

El cuadro siguiente señala la **inversión sectorial** contemplada para la ejecución del Plan en miles de pesos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	SERVICIO	Inversión al 2009	2010	2011	2012	SALDO
<b>Transporte e Infraestructura de Conectividad</b>	Concesiones	493.388	29.856	4.806	0	0
	Aeropuertos	2.209.243	389.800	2.252.950	7.927.597	6.071.887
	Obras Portuarias	7.512.079	7.036.868	12.951.269	12.175.255	40.655.071
	Subsecretaría	1.638.506	5.031.503	2.176.514		5.000.000
	<b>Subtotal</b>	<b>11.853.216</b>	<b>12.488.027</b>	<b>17.385.539</b>	<b>20.102.852</b>	<b>51.726.958</b>
<b>Conectividad Transversal</b>	Vialidad	15.373.322	5.862.061	5.420.365	70.000	0
	<b>Subtotal</b>	<b>15.373.322</b>	<b>5.862.061</b>	<b>5.420.365</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
<b>Conectividad Localidades Aisladas</b>	Aeropuertos	1.254.135	1.767.295	1.770.407	214.184	0
	Vialidad	3.923.971	939.141	3.203.027	2.340.000	3.735.052
	<b>Subtotal</b>	<b>5.178.106</b>	<b>2.706.436</b>	<b>4.973.434</b>	<b>2.554.184</b>	<b>3.735.052</b>
<b>Ejes Longitudinales de Integración</b>	Obras Portuarias	166.365		71.000	331.360	
	Vialidad	73.162.208	17.116.802	26.290.353	46.400.497	37.115.500
	<b>Subtotal</b>	<b>73.328.573</b>	<b>17.116.802</b>	<b>26.361.353</b>	<b>46.731.857</b>	<b>37.115.500</b>
<b>Mejoramiento y Habilitación de Pasos Fronterizos</b>	Vialidad	15.352.976	883.972	4.074.862	3.947.070	4.734.025
	<b>Subtotal</b>	<b>15.352.976</b>	<b>883.972</b>	<b>4.074.862</b>	<b>3.947.070</b>	<b>4.734.025</b>
<b>Conformación de Circuitos Turísticos</b>	Aeropuertos		46.738	68.787		
	Vialidad	8.360.221	2.850.549	3.050.425	5.520.000	2.086.810
	<b>Subtotal</b>	<b>8.360.221</b>	<b>2.897.287</b>	<b>3.119.212</b>	<b>5.520.000</b>	<b>2.086.810</b>
<b>TOTAL</b>		<b>129.446.414</b>	<b>41.954.585</b>	<b>61.334.765</b>	<b>78.925.963</b>	<b>99.398.345</b>
<b>TOTAL BASE</b>		<b>106.630.863</b>	<b>47.911.481</b>	<b>113.624.236</b>	<b>109.428.909</b>	<b>173.434.577</b>

Fuente: Dirplan

Lo más relevante respecto a los montos de inversión, tiene relación con la disminución en casi 140.000 millones de pesos, aunque esto se verá reflejado, a partir del año 2011, especialmente después del año 2012.

## Conclusiones

A. Objetivos Específicos	B. Resultados Esperados	C. Avance
<b>Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De los 26 proyectos asociados a este objetivo se esperaba terminar 8 obras:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Obras Portuarias: 5</li> <li>✓ Aeropuertos : 3</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De los 35 finalmente programados, se han concluido 7 obras, las cuales se detallan a continuación por servicio:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Obras Portuarias: 4</li> <li>✓ Aeropuertos : 3</li> </ul> </li> </ul>
<b>Mejorar Conectividad Transversal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De los 12 proyectos asociados a este objetivo se esperaba terminar 6 obras:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vialidad: 6</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De los 10 finalmente programados, se han concluido 4 obras, las cuales se detallan a continuación por servicio:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vialidad: 4</li> </ul> </li> </ul>
<b>Mejorar Conectividad de Localidades Aisladas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De los 24 proyectos asociados a este objetivo se esperaba terminar 1 obra:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vialidad: 1</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De los 19 finalmente programados, se ha concluido 1 obra, la cual se detalla a continuación:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aeropuertos: 1</li> </ul> </li> </ul>
<b>Consolidación Ejes Longitudinales de Integración</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De los 22 proyectos asociados a este objetivo se esperaba terminar 5 obras:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vialidad: 5</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De los 38 finalmente programados, se han concluido 4 obras, las cuales se detallan a continuación por servicio:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vialidad: 4</li> </ul> </li> </ul>
<b>Mejoramiento y Habilitación de Pasos Fronterizos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De los 7 proyectos asociados a este objetivo se esperaba terminar 1 obras:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vialidad: 1</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De los 6 finalmente programados, se ha concluido 1 obra, la cual se detalla a continuación:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vialidad: 1</li> </ul> </li> </ul>
<b>Conformación de Circuitos Turísticos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De los 9 proyectos asociados a este objetivo se esperaba terminar 4 obras:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vialidad : 3</li> <li>✓ Obras Portuarias: 1</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De los 12 finalmente programados, se ha concluido 1 obra, la cual se detalla a continuación:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vialidad: 1</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Resumen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La cartera de proyectos creció a 120 iniciativas, a pesar de que se eliminaron 37; no obstante lo anterior, los montos de inversiones decrecieron 140.000 millones aproximadamente.</li> <li>Se pretendían ejecutar 25 de 100 proyectos (25%), y lo que se logró fueron 18 de 119 (15%)</li> <li>Se terminaron 18 obras de un total de 25 que se había planificado, es decir un 72%.</li> </ul>		

**ANEXO: LISTADO DE PROYECTOS DEL PLAN**

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Los Ríos	30070730-0	REPOSICION RAMPAS PUERTO FUY Y PUERTO PIRIHUEICO, PANGUIPULLI	104.248	66.865	1.976.663	1.682.212		Inicio Obras 2011
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Los Ríos	30001439-0	CONSTRUCCION RAMPA PARA PASAJEROS Y CARGA FUTRONO	530.232					Obras Terminadas
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Los Ríos	30077492-0	REPOSICION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA		139.662				Obras Terminadas
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	SOP	Los Ríos	20137511-0	Diseño y Construcción de transbordador para la ruta Niebla Corral		1.149.998				Obras en Ejecución
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea,	CCOP	Los Lagos-Aysén	29000166-0	CONECTIVIDAD X Y XI NORTE (NUEVO)	181.374	10.971	1.602			Prefactibilidad en Ejecución

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Marítima,Fluvial y Lacustre										
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima,Fluvial y Lacustre	SOP	Los Lagos-Aysén	SIN CÓDIGO	Diseño y Construcción de Transbordador Ruta Isla Puluqui - Calbuco		817.326	1.000.843			Obras en Ejecución
Mejorar Conectividad de localidades aisladas	DAP	Los Lagos	30081400-0	CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA. X REGION	332.601	613.632	193.971			Obras en Ejecución
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima,Fluvial y Lacustre	DAP	Los Lagos	30083769-0	REPOSICION AERÓDROMO CHAITÉN. PROVINCIA DE PALENA, X REGIÓN	712.191	274.295	2.173.300	7.927.597	6.071.887	Diseño en Ejecución
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima,Fluvial y Lacustre	DOP	Los Lagos	30033863-0	MEJORAMIENTO RAMPA DE CONEXION ISLA PULUQUI, SECTOR MACHIL, CALBUCO	1.220.588	60.925				Obras Terminadas

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Mejorar Conectividad de localidades aisladas	DAP	Los Lagos	30081379-0	CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE. X REGIÓN	453.929	350.395	405.468			Obras en Ejecución
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Los Lagos	30063047-0	CONSTRUCCION RAMPAS PARA BARCAZAS LAGO TAGUA TAGUA	80.759		667.049	166.497		Inicio Obras 2011
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Los Lagos	30071254-0	MEJORAMIENTO RAMPAS MAULLIN Y LA PASADA, MAULLIN	94.211	34.860	1.941.191			Inicio Obras 2011
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Los Lagos	30074624-0	CONSTRUCCION RAMPA COSTANERA DE CALBUCO	113.906	179.250	3.224.204			Obras en Ejecución

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Los Lagos	30076814-0	CONSERVACION RAMPA PUELICHE COMUNA HUALAIHUE	122.897					Obras Terminadas
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Los Lagos	30092447-0	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUNTA CHEQUIAN, QUINCHAO	167.700	111.856	4.599	3.000.000	2.000.000	Inicio Obras posterior 2011
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Los Lagos	30083092-0	CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAES. PESCA ARTESANAL CHAITEN	197.418	223.260	216.880	500.000	9.500.000	Diseño en Ejecución
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Los Lagos	30069743-0	MEJORAMIENTO INFR. PORT. RED CONECTIVIDAD PUERTO MONTT - CHILOE - PALENA	167.700	111.856	547.825	1.526.342	3.469.098	Inicio Obras 2011

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Los Lagos	30069743-0	MEJORAMIENTO INFR. PORT. RED CONECTIVIDAD PUERTO MONTT - CHILOE - PALENA	167.700	111.856	4.601	279.389	896.997	Inicio Obras posterior 2011
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Los Lagos	30069743-0	MEJORAMIENTO INFR. PORT. RED CONECTIVIDAD PUERTO MONTT - CHILOE - PALENA	167.700	111.856	4.601	279.389	896.997	Inicio Obras posterior 2011
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Los Lagos	30069743-0	MEJORAMIENTO INFR. PORT. RED CONECTIVIDAD PUERTO MONTT - CHILOE - PALENA	167.700	111.856	4.601	279.389	896.997	Inicio Obras posterior 2011

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Los Lagos	30069743-0	MEJORAMIENTO INFR. PORT. RED CONECTIVIDAD PUERTO MONTT - CHILOE - PALENA	167.700	111.856	4.601	279.389	896.997	Inicio Obras posterior 2011
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Los Lagos	30069743-0	MEJORAMIENTO INFR. PORT. RED CONECTIVIDAD PUERTO MONTT - CHILOE - PALENA	167.700	111.856	4.601	279.389	896.997	Inicio Obras posterior 2011
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Los Lagos	30061316-0	REPOSICION VARIOS PUENTES EN RUTA 7 S: CALETA PUELICHE-RIO NEGRO-HORNOPIREN	1.574.279	188.794				Obras Terminadas
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Los Lagos	30068171-0	REPOSICION RIPIO RUTA 7 S:HORNOPIREN-RAMPA PICHANCO	1.081.148	1.554.272	1.033.000	200.000		Obras en Ejecución
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Los Lagos	30071186-0	CONSTRUCCION RUTA 7 SECTOR: PICHANCO - LEPTEPÚ			300.000	300.000	500.000	Inicio Prefactibilidad 2011
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Los Lagos	30071452-0	MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR STA. LUCIA-LIMITE REGIONAL .	46.160	231.584	79.259	38.259		Diseño en Ejecución

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Los Lagos	30072555-0	MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: MICHIMAHUIDA-PTO. CARDENAS (PTE. YELCHO) .		11.731	2.780.000	4.713.178		Obras en Ejecución
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Los Lagos	30076518-0	MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA .	1.033.702	1.621.432	47.000	2.130.000	3.250.000	Obras en Ejecución
Mejoramiento y Habilitación de pasos fronterizos	DV	Los Lagos	20080167-0	CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON -	13.091.839	723.350	550.000	669.487		Obras en Ejecución
Mejoramiento Conectividad Transversal	DV	Los Lagos	20187050-0	REPOSICION RIPIO RUTA 231-CH PTO. RAMIREZ-FUTALEUFU- PASO FUTALEUFU -	158.606					Diseño terminado
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Los Lagos	30070432-0	AMPLIACION RUTA 7 SECTOR RÍO PUELICHE - PELLUCO -	18.778	173.300	86.426			Diseño en Ejecución
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Los Lagos	20188338-0	AMPLIACION REPOS PAV. RUTA 7 SECTOR: PTO. MONTT - PELLUCO	85.238	801.379	2.275.782	1.382.408		Inicio Obras 2011
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Los Lagos	30087340-0	MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR CALETA PUELICHE - PICHICOLO			199.000	400.000		Inicio Diseño 2011
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Los Lagos	30088077-0	MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PICHICOLO- HORNOPIREN			540.000	4.860.000		Inicio Obras 2011
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Los Lagos	SIN CÓDIGO	Pavimentación Puerto Cárdenas-Villa Santa Lucía 32 kms.						Proyectos No Programados

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Los Lagos	SIN CÓDIGO	MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR LEPTÉPU-FIORDO LARGO(C.M.T) -						Proyectos No Programados
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Los Lagos	30071476-0	REPOSICION RIPIO RUTA 7 SECTOR LEPTÉPU-FIORDO LARGO(C.M.T) -			70.000	1.950.000		Inicio Obras 2011
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Los Lagos	SIN CÓDIGO	Construcción Fiordo Largo-Caleta Gonzalo						Proyectos No Programados
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Los Lagos	30093395-0	MEJORAMIENTO RUTA W-807-R-7, S: PTE CAMAHUETO - ROTONDA DE CHAITEN						Proyectos No Programados
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Los Lagos	30093397-0	CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 7(LAGO RIO NEGRO)-COSTERO(CHANA						Proyectos No Programados
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Los Lagos	SIN CÓDIGO	Construcción By Pass Chaitén						Proyectos No Programados
mejorar conectividad de localidades aisladas	DV	Los Lagos	30090965-0	CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SANTA BARBARA-LOYOLA SECTOR PUENTE BLANCO - PUENTE NEGRO						Proyectos No Programados
mejorar conectividad de localidades aisladas	DV	Los Lagos	SIN CÓDIGO	Construcción Camino Costero Península Huequi-Palena/Buill-Ayacara-Poyo						Proyectos No Programados

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Mejoramiento Conectividad Transversal	DV	Los Lagos	SIN CÓDIGO	Mejoramiento Villa Santa Lucía-Palena						Proyectos No Programados
Mejoramiento y Habilitación de pasos fronterizos	DV	Los Lagos	30033733-0	CONSTRUCCION CAMINO ACCESO PASO FRONTERIZO RIO MANSO (CMT) .-	339.736		2.662.861	1.341.342	4.024.025	Diseño terminado
mejorar conectividad de localidades aisladas	DAP	Aysén	30081437-0	CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS, REGION XI	185.424	545.251				Obras Terminadas
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DAP	Aysén	30036985-0	CONSTRUCCION REFUGIO Y ESTACIONAMIENTO AERODROMO MELINKA, XI REGIÓN	166.233					Obras Terminadas
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DAP	Aysén	30077477-0	AMPLIACION AREA ESTAC. AERON. Y CONSTR.CIERROS OACI AERÓD. MELINKA	369.698					Obras Terminadas

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Conformación de circuitos turísticos	DAP	Aysén	30081443-0	CONSTRUCCION REFUGIO PASAJEROS AERODROMO LAGUNA SAN RAFAEL		46.738	68.787			Obras en Ejecución
mejorar conectividad de localidades aisladas	DAP	Aysén	30089786-0	Mejoramiento Aeródromo de Puerto Cisnes						Proyectos No Programados
mejorar conectividad de localidades aisladas	DAP	Aysén	30089786-0	Mejoramiento Aeródromo de Puyuhuapi						Proyectos No Programados
mejorar conectividad de localidades aisladas	DAP	Aysén	30089786-0	Ampliación plataforma y construcción refugio de pasajeros aeródromo Raúl Marín Balmaceda						Proyectos No Programados
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DAP	Aysén	30091497-0	CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO TENIENTE VIDAL, COYHAIQUE. XI REGIÓN		76.125	79.650			Obras en Ejecución
mejorar conectividad de localidades aisladas	DAP	Aysén	30091498-0	CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS, XI REGION		55.825	986.656			Obras en Ejecución

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	SOP	Aysén	SIN CÓDIGO	DISEÑO Y CONSTRUCCION TRANSBORDADOR PARA CRUCE LAGO GENERAL CARRERA	1.638.506	3.064.179	1.175.671			Obras en Ejecución
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Aysén	30063563-0	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION EN MELIMOYU, CISNES	76.134		51.650	802.350		Inicio Obras 2011
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DOP	Aysén	30043711-0	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONEXION BAJO RIO PASCUA, TORTEL	166.365					Diseño Terminado
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Aysén	30069745-0	MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSÉN	648.173	400.709	284.647	15.631	20.830.000	Diseño en Ejecución
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Aysén	30069169-0	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAEST. PORTUARIA L. GENERAL CARRERA	73.647	110.507	197.806			Diseño en Ejecución

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Aysén	30064831-0	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION EN PTO. YUNGAY	84.937		365.510	196.279		Inicio Obras 2011
Mejoramiento Conectividad Transversal	DV	Aysén	30042716-0	REPOSICION PUENTES EN RUTA 7, SECTOR : RIO BRAVO - VILLA O HIGGINS	2.262.195					Obras Terminadas
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Aysén	20151713-0	CONSTRUCCION CNO. PUERTO YUNGAY (RIO BRAVO) - VENTISQUERO MONTT	8.447.070	807.651	862.331			Obras en Ejecución
mejorar conectividad de localidades aisladas	DV	Aysén	30035697-0	CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE-RIO TRANQUILO-E.MAYER(CMT	3.922.721	391.153	1.619.744			Obras en Ejecución
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Aysén	30042718-0	REPOSICION PUENTES EN RUTA 7, SECTOR: COCHRANE - PUERTO YUNGAY	627.587					Obras Terminadas

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Mejoramiento Conectividad Transversal	DV	Aysén	30073043-0	REPOSICION CAMINO PTO. TRANQUILO - EXPLORADORES, AYSÉN						Proyectos No Programados
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Aysén	30074744-0	MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, CERRO CASTILLO km.95-KM.235		87.010	85.461	3.462		Diseño en Ejecución
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Aysén	30074744-0	MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, CERRO CASTILLO km.95-KM.235		87.010	85.461	3.462		Diseño en Ejecución
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Aysén	30074744-0	MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, CERRO CASTILLO km.95-KM.235		87.010	85.461	3.462		Diseño en Ejecución



Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Aysén	30074744-0	MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, CERRO CASTILLO km.95-KM.235		87.010	85.461	3.462		Diseño en Ejecución
Mejoramiento y Habilitación de pasos fronterizos	DV	Aysén	20188444-0	MEJORAMIENTO RUTA 265-CH. SECTOR: CHILE CHICO-PASO RIO JEINIMENI	1.909.012					Obras Terminadas
Mejoramiento Conectividad Transversal	DV	Aysén	30055551-0	REPOSICION RUTA X-65 SECTOR: PUERTO IBANEZ - PASO PALAVICINI	951.870					Obras Terminadas
Mejoramiento Conectividad Transversal	DV	Aysén	20171016-0	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO A PUERTO CISNES	6.846.091	5.827.061	4.895.601			Obras en Ejecución
Mejoramiento Conectividad Transversal	DV	Aysén	30036730-0	MEJORAMIENTO RUTA X-65 CRUCE RUTA 7, II ETAPA	3.437.872					Obras Terminadas
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Aysén	30057680-0	MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR : PUYUHUAPI - LA JUNTA	7.916.944	1.617.290	77.903	5.750.000	6.795.000	Obras en Ejecución

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Aysén	30057681-0	MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: PUYUHUAPI - EL QUEULAT	57.301		14.000	4.550.000	3.400.000	Inicio Obras 2011
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Aysén	30065318-0	MEJORAMIENTO LA ZARANDA - BIF. CISNES, ETAPA II .	6.641.797	2.511.014	6.591.004			Obras en Ejecución
Mejoramiento Conectividad Transversal	DV	Aysén	30065320-0	ADQUISICION BARCAZA EN EL RIO PALENA	1.716.688					Obras Terminadas
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Aysén	30067730-0	CONSTRUCCION CAMINO PUERTO CISNES - FIORDO QUEULAT, CISNES .-	52.747					Prefactibilidad Terminada
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Aysén	30068849-0	MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LIMITE REGIONAL NORTE -			113.630	2.800.000	10.350.000	Inicio Obras 2011
Mejoramiento Conectividad Transversal	DV	Aysén	30073035-0	REPOSICION CAMINO LA JUNTA PTO. RAUL MARIN B., CISNES -		35.000	524.764	70.000		Diseño en Ejecución

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Mejoramiento Conectividad Transversal	DV	Aysén	30083372-0	ADQUISICION BARCAZA EN EL RIO EXPLORADORES .						Proyectos No Programados
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	CCOP	Los Lagos-Aysén	29000167-0	CONECTIVIDAD X Y XI SUR (NUEVO	184.563	9.243	1.602			Prefactibilidad en Ejecución
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	SOP	Magallanes	SIN CÓDIGO	Diseño y construcción Transbordador Ruta Porvenir-Punta Arenas					5.000.000	Inicio Obras posterior 2011
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	CCOP	Magallanes	29000173-0	CONECTIVIDAD REGIÓN XII DE MAGALLANES	127.451	9.642	1.602			Prefactibilidad en Ejecución
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DAP	Magallanes	30063485-0	MEJORAMIENTO PISTA 03-21 AERÓDROMO CAPITÁN FUENTES MARTÍNEZ PORVENIR	961.121	39.380				Obras Terminadas

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
mejorar conectividad de localidades aisladas	DAP	Magallanes	20192595-0	CONSTRUCCION PEQUEÑO AERODROMO YENDEGAIA COMUNA CABO DE HORNS			110.626	214.184		Inicio Diseño 2011
mejorar conectividad de localidades aisladas	DAP	Magallanes	30046464-0	MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO TTE. MARSH ANTARTICA CHILENA ANTARTICA, REGION XII	121.749	200.932	73.686			Diseño en Ejecución
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DAP	Magallanes	SIN CÓDIGO	Ampliación edificio terminal aeródromo Guardiamarina Zañartu, Puerto Williams						Proyectos No Programados
mejorar conectividad de localidades aisladas	DAP	Magallanes	30071367-0	CONSTRUCCION PEQUEÑO AERODROMO CALETA MARIA, TIMAUKEL, XII REGION	160.432	1.260				Diseño terminado

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DAP	Magallanes	30081941-0	AMPLIACION PISTA Y EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO TENIENTE GALLARDO, PUERTO NATALES, XII REGIÓN.						Proyectos No Programados
mejorar conectividad de localidades aisladas	DAP	Magallanes	SIN CÓDIGO	Construcción refugio Aeródromo San Sebastián						Proyectos No Programados
mejorar conectividad de localidades aisladas	DAP	Magallanes	30081318-0	Construcción refugio Aeródromo Pampa Guanaco						Proyectos No Programados
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Magallanes	20196156-0	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTO NAVARINO	208.065	84.050				Diseño terminado

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Magallanes	30046784-0	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RAMPAS BAHÍA CHILOTA Y BAHIA CATALINA, XII REGION	749.192	2.494.680	125.158			Obras en Ejecución
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Magallanes	30080008-0	MEJORAMIENTO TERMINAL PARA TRANSBORDADORES PUERTO WILLIAMS, ISLA NAVARINO	49.018	541.489	976.547			Obras en Ejecución
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Magallanes	20136387-0	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN	1.597.608	560.168	2.264.905			Obras en Ejecución
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Magallanes	20092334-0	CONSTRUCCION RAMPAS SENO ULTIMA ESPERANZA, XII REGION	368.833	1.203.446				Obras en Ejecución
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DOP	Magallanes	30000548-0	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA MARÍA			71.000	331.360		Obras en Ejecución

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Mejorar Servicios de Transporte e Infraestructura de Conectividad Terrestre, Aérea, Marítima, Fluvial y Lacustre	DOP	Magallanes	30071284-0	MEJORAMIENTO TERMINALES PARA TRANSBORDADORES PRIMERA ANGOSTURA	18.312	154.003	83.631	2.889.000	370.990	Obras en Ejecución
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Magallanes	20158231-0	MEJORAMIENTO PUNTA ARENAS-FTE. BULNES(II), RIO AMARILLO-BIF.FTE. BULNES	821.643	3.770.234	2.187.813	3.831.449	2.058.408	Obras en Ejecución
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Magallanes	30068893-0	AMPLIACION CAMINO PUNTA ARENAS-AEROPUERTO	76.349	361.336	3.288.648	2.459.979		Obras en Ejecución
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Magallanes	20158014-0	MEJORAMIENTO RUTA 9, SECTOR CUEVA DEL MILODON - CERRO CASTILLO	17.498.533	604.657				Obras Terminadas
Conformación de circuitos turísticos	DV	Magallanes	20186784-0	CONSTRUCCION PUENTE WEBER, RUTA Y-156, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA	119.983	1.312.784	807.731			Obras en Ejecución
Conformación de circuitos turísticos	DV	Magallanes	30002367-0	CONSTRUCCION CAMINO RIO SERRANO - PASO BELLAVISTA	257.983					Diseño terminado

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Mejoramiento y Habilitación de pasos fronterizos	DV	Magallanes	30043202-0	MEJORAMIENTO RUTA Y-205, CAMINO CASTILLO-FRONTERA, T, DEL PAINE, XIIR	12.389	110.622	186.000	1.680.000	710.000	Inicio Obras 2011
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Magallanes	30061313-0	CONSTRUCCION PUENTE EL NEGRO, RUTA 9 NORTE KM 339,86 U. ESPERANZA		1.216.284	856.867			Obras en ejecución
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Magallanes	20080170-0	CONSTRUCCION CAMINO ESTANCIA VICUNA - YENDEGAIA	12.607.941	1.284.000	1.207.921	728.163	986.752	Obras en Ejecución
Mejoramiento y Habilitación de pasos fronterizos	DV	Magallanes	30073331-0	MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSIN - SAN SEBASTIAN, XIIR		50.000	676.001	256.241		Diseño en Ejecución
Conformación de circuitos turísticos	DV	Magallanes	SIN CÓDIGO	Construcción Camino de Penetración río Serrano-Glaciario Tyndall						Proyectos No Programados

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Conformación de circuitos turísticos	DV	Magallanes	30093394-0	CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION BAHIA TALCAHUANO-CR.EST WORSLEY .			65.000	1.780.000	680.000	Inicio Obras 2011
Conformación de circuitos turísticos	DV	Magallanes	30093396-0	CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES .			10.000	500.000	180.000	Inicio Prefactibilidad 2011
Conformación de circuitos turísticos	DV	Magallanes	20136553-0	Construcción Puente Las Torres		75.002	165.034			Diseño en Ejecución
Conformación de circuitos turísticos	DV	Magallanes	20034168-0	CONSTRUCCION CAMINO PTO.NATALES-LAGO PORTENO-PARQUE NAC.T.DEL PAINE	7.982.255					Obras Terminadas
Conformación de circuitos turísticos	DV	Magallanes	20102690-0	CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ -		1.311.130	155.000	1.540.000	1.220.000	Obras en Ejecución

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Conformación de circuitos turísticos	DV	Magallanes	20102690-0	CONSTRUCCION CAMINO HOLLEMBERG - RIO PEREZ - RIO						Proyectos No Programados
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Magallanes	30087338-0	MEJORAMIENTO RUTA 9, NATALES-PTO.BORIES, ULT.ESPERANZA, XII REGION .			104.000	2.016.000	1.468.000	Inicio Obras 2011
Conformación de circuitos turísticos	DV	Magallanes	30037766-0	CONSTRUCCION CO. DE PENETRACIÓN MONTE FENTON-S.OTWAY		127.002	147.660			Prefactibilidad en Ejecución
Conformación de circuitos turísticos	DV	Magallanes	20075928-0	Construcción Camino de Penetración San Juan-Cabo Froward		24.631	1.700.000	1.700.000	6.810	Obras en Ejecución
Conformación de circuitos turísticos	DV	Magallanes	SIN CÓDIGO	Construcción Camino de penetración Rí Canelo-Isla Carlos III						Proyectos No Programados

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Magallanes	20090336-1	MEJORAMIENTO RUTA 257 - CH SECTOR BAHIA AZUL - CERRO SOMBRERO	10.923.486					Obras Terminadas
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Magallanes	20111842-1	MEJORAMIENTO RUTA Y -79 S CERRO SOMBRERO - ONAISSIN (PRIMAVERA	3.651.505	12.805	2.970.187	8.201.053	5.307.340	Obras en Ejecución
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Magallanes	SIN CÓDIGO	Mejoramiento Onaissin-Cameron						Proyectos No Programados
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Magallanes	SIN CÓDIGO	Mejoramiento Cameron-Rusffin						Proyectos No Programados
Consolidación Ejes longitudinales de integración	DV	Magallanes	30072419-0	CONSTRUCCION PUENTE RIO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y-85		1.000	263.738	76.162	3.000.000	Diseño en Ejecución

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
Mejoramiento y Habilitación de pasos fronterizos	DV	Magallanes	20187578-0	MEJORAMIENTO RUTA Y-71 PORVENIR-ONAISSIN						Proyectos No Programados
mejorar conectividad de localidades aisladas	DV	Magallanes	SIN CÓDIGO	Conectividad Cruce Ruta Y 65 - Pto. Percy - Cruce Ruta 255						Proyectos No Programados
mejorar conectividad de localidades aisladas	DV	Magallanes	30104615-0	CONSTRUCCION Cº DE PENETRACION CAMERON - PUERTO ARTURO, XII			90.000	1.000.000		Inicio Diseño 2011
mejorar conectividad de localidades aisladas	DV	Magallanes	30075545-0	REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES	1.250	359.000	171.997			Diseño en Ejecución
mejorar conectividad de localidades aisladas	DV	Magallanes	20075933-0	CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN		33.845	434.107			Prefactibilidad en Ejecución

Objetivo Estratégico	Servicio	Región	Código BIP	Proyecto	2009	2010	2011	2012	SALDO	Estado Proyecto
mejorar conectividad de localidades aisladas	DV	Magallanes	30076653-0	MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PTO. WILLIA		153.001	87.179	540.000	3.640.000	Diseño en Ejecución
mejorar conectividad de localidades aisladas	DV	Magallanes	30076970-0	MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR-MANANTIALES, T. DEL FUEGO, XIIR.		2.142	800.000	800.000	95.052	Diseño en Ejecución
